


Обоснование паспорта приоритетного проекта «Здравоохранение»

по направлению

«Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»

(«Электронное здравоохранение»)

1. СТРУКТУРНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ (ПРОДУКТА) ПРОЕКТА

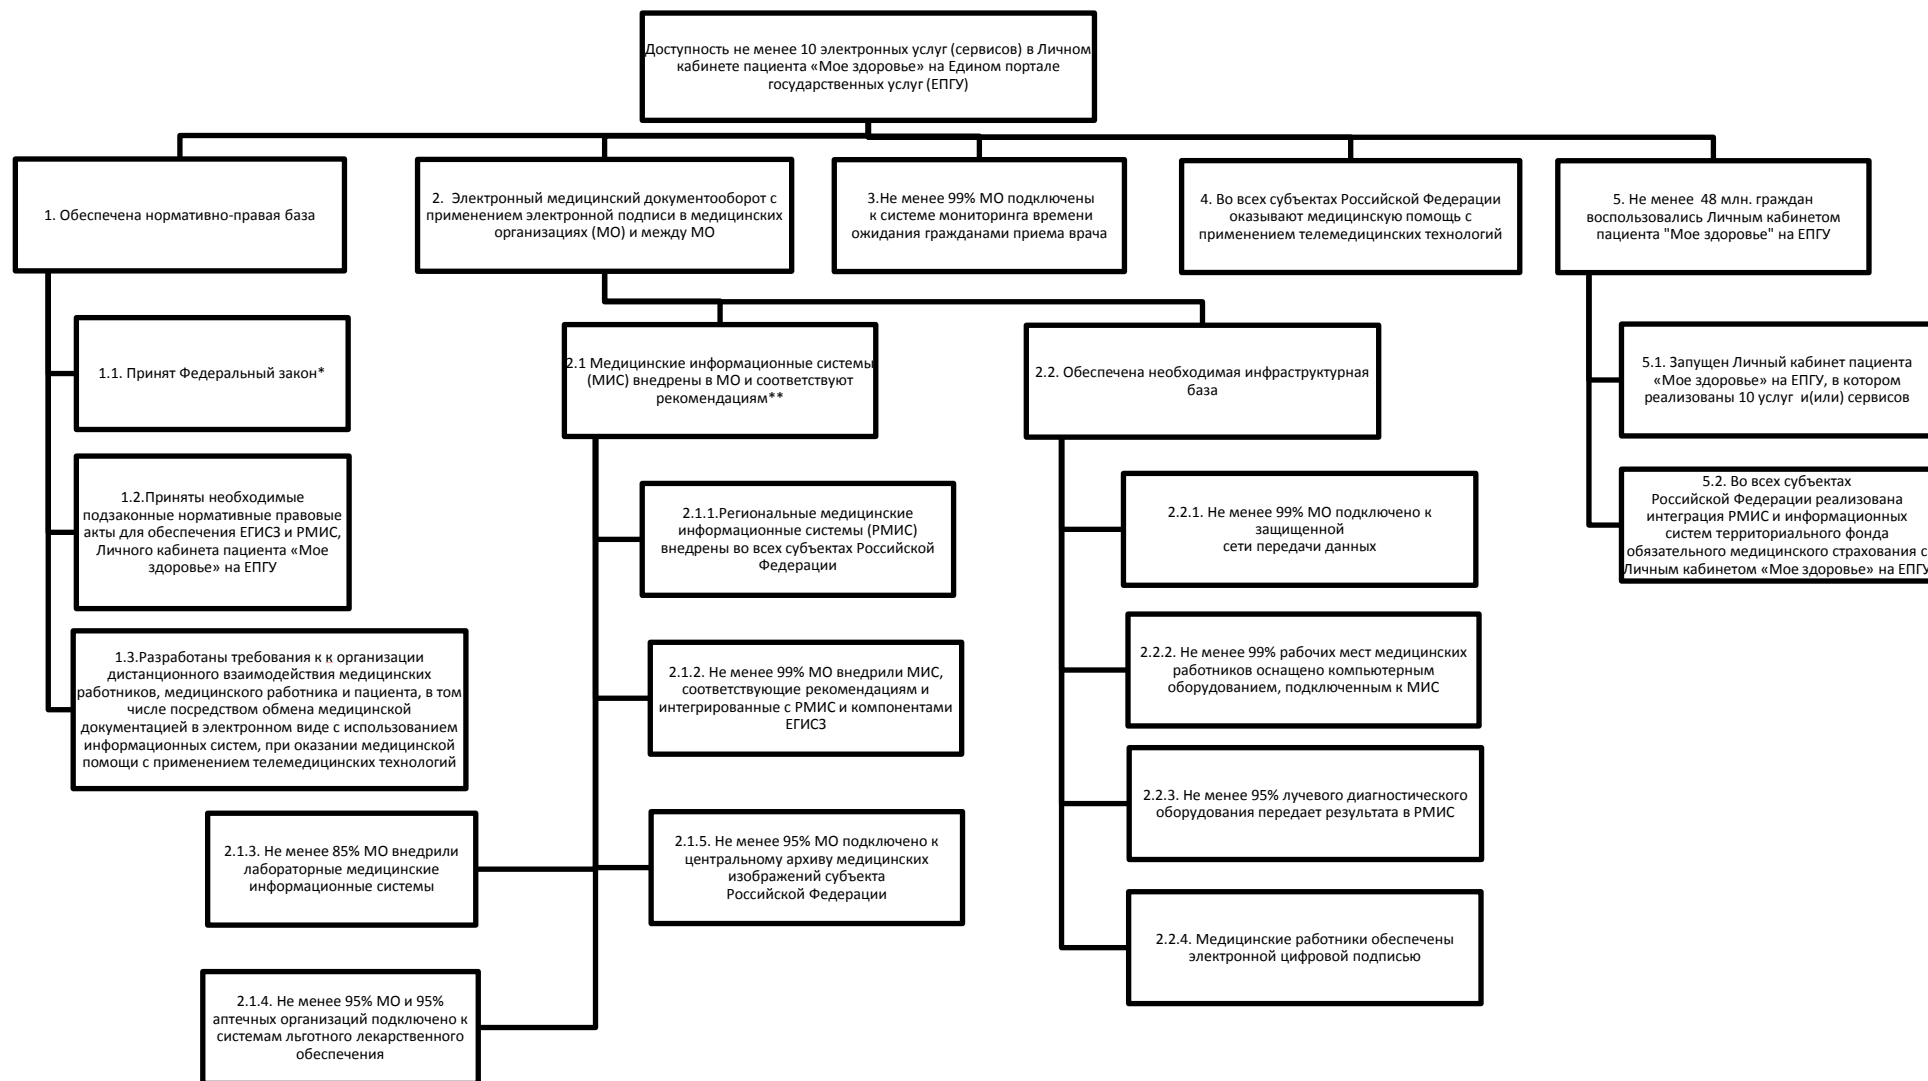

* - Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения»

** Медицинские информационные системы, соответствующие расширенному уровню функциональных возможностей в соответствии с утверждёнными методическими рекомендациями.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4.48	Контрольная точка. Не менее 20% МО выписывают рецепты в электронном виде		20.01.2018	20.01.2018																	
4.49	Контрольная точка. Не менее 40% МО выписывают рецепты в электронном виде		20.01.2019	20.01.2019																	
4.50	Контрольная точка. Не менее 55% МО выписывают рецепты в электронном виде		20.01.2020	20.01.2020																	
4.51	Контрольная точка. Не менее 70% МО выписывают рецепты в электронном виде		20.01.2021	20.01.2021																	
4.52	Контрольная точка. Не менее 90% МО выписывают рецепты в электронном виде		10.12.2025	10.12.2025																	
5	Контрольная точка. Проект завершен		31.12.2025	31.12.2025																	
	Итого	3390	19.09.2016	31.12.2025																	

3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок	Ответственный	Уровень контроля
1.	Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)	Контрольная точка	25.10.2016	Минздрав России	Президиум Совета
2.	Нормативно-правовое обеспечение				

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок	Ответственны й	Уровень контроля
2.1	<i>Принят федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.01.2017</i>	<i>Минздрав России</i>	<i>Проектный комитет</i>
2.2	<i>Разработаны нормативные правовые акты для обеспечения функционирования Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>31.03.2017</i>	<i>Минздрав России</i>	<i>Проектный комитет</i>
2.3	<i>Разработаны нормативные правовые акты для обеспечения функционирования ЕГИСЗ и региональных медицинских информационных систем, возможности ведения медицинской документации в электронном виде</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>30.10.2017</i>	<i>Минздрав России</i>	<i>Проектный комитет</i>
2.4	<i>Разработаны требования к организации дистанционного взаимодействия медицинских работников, медицинского работника и пациента, в том числе посредством обмена медицинской документацией в электронном виде с использованием информационных систем, при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>15.01.2018</i>	<i>Минздрав России</i>	<i>Проектный комитет</i>
3.	<i>Этапы создания Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ</i>				
3.1	<i>Запущена страница Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ и</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.03.2017</i>	<i>Минздрав России</i>	<i>Проектный комитет</i>

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок	Ответственный	Уровень контроля
	<i>портальные формы электронных сервисов 1 очереди (запись к врачу, вызов врача на дом¹ (для пилотных субъектов), сведения об оказанной медицинской помощи из электронной медицинской карты, сведения о полисе ОМС и страховой медицинской организации, сведения о прикреплении к медицинской организации)</i>				
3.2	<i>Доработаны компоненты ЕГИСЗ, реализован функционал необходимый для организации оказания гражданам электронных услуг (сервисов) в сфере здравоохранения в том числе посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, мониторинга возможности записи на прием к врачу</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.09.2017</i>	<i>Минздрав России</i>	<i>Проектный комитет</i>
3.3	<i>Разработана система контроля качества работы медицинской организации в том числе посредством сервиса оценки в Личном кабинете «Мое здоровье» на ЕПГУ</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.09.2017</i>	<i>Минздрав России</i>	<i>Проектный комитет</i>
3.4	<i>Запущены порталные формы электронных сервисов 2 очереди (электронные медицинские документы, сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости, оформление полиса ОМС, оценка удовлетворенности качеством работы медицинских организаций, запись на плановые</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.09.2017</i>	<i>Минздрав России</i>	<i>Проектный комитет</i>

¹ Решение о поддержке сервиса по вызову врача на дом принимается на уровне субъекта Российской Федерации.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок	Ответственны й	Уровень контроля
	<i>медицинские осмотры) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ</i>				
3.5	<i>Доработаны региональные медицинские информационные системы субъектов Российской Федерации, информационные системы Территориальных фондов обязательного медицинского страхования, обеспечена их интеграция с электронными сервисами Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>31.03.2018</i>	<i>Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации</i>	<i>Проектный комитет</i>
3.6	<i>Разработан план дальнейшего развития Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>31.10.2018</i>	<i>Минздрав России</i>	<i>Проектный комитет</i>
4.	<i>Этапы организации инфраструктурного и программного обеспечения системы здравоохранения субъектов Российской Федерации</i>				
4.1	<i>Не менее 25% медицинских организаций внедрили медицинские информационные системы, интегрированные с региональными информационными системами и компонентами ЕГИСЗ</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>20.01.2018</i>	<i>Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации</i>	<i>Проектный комитет</i>

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок	Ответственны й	Уровень контроля
4.2	<i>Не менее 40% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам, и электронными подписями</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>20.01.2018</i>	<i>Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации</i>	<i>Проектный комитет</i>
4.3	<i>Разработаны планы мероприятий субъектов Российской Федерации по организации инфраструктурного и программного обеспечения системы здравоохранения субъектов до 2020 года</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>31.10.2018</i>	<i>Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации</i>	<i>Проектный комитет</i>
4.4	<i>Не менее 40% медицинских организаций внедрили медицинские информационные системы, интегрированные с региональными информационными системами и компонентами ЕГИСЗ</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>20.01.2019</i>	<i>Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации</i>	<i>Проектный комитет</i>
4.5	<i>Не менее 60% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>20.01.2019</i>	<i>Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации</i>	<i>Проектный комитет</i>

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок	Ответственны й	Уровень контроля
	<i>медицинским информационным системам, и электронными подписями</i>			<i>Федерации</i>	
4.6	<i>Разработаны планы мероприятий субъектов Российской Федерации по организации инфраструктурного и программного обеспечения системы здравоохранения субъектов до 2023 года</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>31.10.2020</i>	<i>Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации</i>	<i>Проектный комитет</i>
4.7	<i>Не менее 70% медицинских организаций внедрили медицинские информационные системы, интегрированные с региональными информационными системами и компонентами ЕГИСЗ</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>20.01.2021</i>	<i>Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации</i>	<i>Проектный комитет</i>
4.8	<i>Не менее 80% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь дооснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам, и электронными подписями</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>20.01.2021</i>	<i>Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации</i>	<i>Проектный комитет</i>

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок	Ответственны й	Уровень контроля
4.9	<i>Разработаны планы мероприятий субъектов Российской Федерации по организации инфраструктурного и программного обеспечения системы здравоохранения субъектов до 2025 года</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>31.10.2023</i>	<i>Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации</i>	<i>Проектный комитет</i>
4.10	<i>Не менее 99% медицинских организаций внедрили медицинские информационные системы, интегрированные с региональными информационными системами и компонентами ЕГИСЗ</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>10.12.2025</i>	<i>Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации</i>	<i>Проектный комитет</i>
4.11	<i>Не менее 99% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам, и электронными подписями</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>10.12.2025</i>	<i>Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации</i>	<i>Проектный комитет</i>
4.12	<i>Во всех субъектах Российской Федерации организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в соответствии с требованиями Минздрава России</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>10.12.2025</i>	<i>Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации</i>	<i>Проектный комитет</i>

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок	Ответственный	Уровень контроля
4.13	<i>Не менее 99% медицинских организаций подключены к системе мониторинга возможности записи на прием к врачу</i>	<i>Контрольная точка</i>	10.12.2025	<i>Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации</i>	<i>Проектный комитет</i>

4. РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

№ п/п	Организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта
1.	<i>Министерство здравоохранения Российской Федерации</i>	<i>И.Н. Каграманян, Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации</i>	<i>Повышение качества оказываемых услуг гражданам и информационного обеспечения в сфере охраны здоровья, снижение нагрузки на медицинские организации первичного звена и времени ожидания граждан при оказании медицинской помощи за счет перевода части оказываемых гражданам услуг по получению медицинских документов в электронный вид, возможность контроля удовлетворенности граждан работой медицинских организаций.</i>
2.	<i>Министерство связи и массовых коммуникаций</i>	<i>Н.А. Никифоров, Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации</i>	<i>Возможность предоставления гражданам государственных услуг и сервисов в области здравоохранения в электронном виде через Личный кабинет «Мое здоровье» на Едином портале</i>

№ п/п	Организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта
			государственных услуг
3.	ФОМС	<i>Н.Н. Стадченко, Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования</i>	<i>Реализация информационного взаимодействия между медицинскими и страховыми организациями. Доступность в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ электронных услуг (сервисов): сведения о полисе ОМС и страховой медицинской организации, сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости, оформление полиса ОМС.</i>
4.	<i>Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и информационных технологий</i>	<i>Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и информационных технологий</i>	<i>Информационное взаимодействие между всеми медицинскими организациями и организация централизованных региональных компонентов. Контроль удовлетворенности граждан результатами работы медицинских организаций.</i>
5.	<i>Медицинские организации</i>	<i>Руководители медицинских организаций</i>	<i>Снижение нагрузки на медицинские организации первичного звена за счет перевода части оказываемых гражданам услуг по получению медицинских документов в электронный вид. Доступ медицинских работников к образовательным и справочным информационным ресурсам.</i>

5. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Несвоевременное принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения» и соответствующих подзаконных нормативных правовых актов	Нарушены сроки, не достигнуты цели проекта	Принятие необходимых нормативно-правовых актов на уровне субъектов Российской Федерации, доработка законопроекта для повторного внесения в Правительство Российской Федерации	средняя	сильный
2.	Финансовые ограничения субъектов Российской Федерации при реализации мероприятий по внедрению информационных технологий в здравоохранение могут оказать влияние на сроки проекта	Нарушены сроки, не достигнуты цели проекта	Регулярный мониторинг финансирования мероприятий субъектами Российской Федерации	высокая	сильный
3.	Несоблюдение субъектами Российской Федерации обязательств по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015-2018 гг. развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	Нарушены сроки	Регулярный мониторинг исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015-2018 гг. развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, адресная работа с «отстающими» субъектами	высокая	средний

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование риска</i>	<i>Ожидаемые последствия</i>	<i>Мероприятия по реагированию</i>	<i>Вероятность наступления</i>	<i>Уровень влияния на проект</i>
			<i>Российской Федерации, разработка и утверждение методических рекомендаций</i>		
4.	<i>Отсутствие и несвоевременное развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в населенных пунктах субъектов Российской Федерации.</i>	<i>Нарушены сроки, телемедицинские услуги доступны не всем гражданам Российской Федерации</i>	<i>Взаимодействие с Министерством связи и массовых коммуникаций в сфере развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в населенных пунктах субъектов Российской Федерации</i>	<i>низкая</i>	<i>средний</i>
5.	<i>Отсутствие, несвоевременная разработка единых требований к обеспечению электронного медицинского документооборота</i>	<i>Не достигнуты цели проекта</i>	<i>Привлечение экспертного сообщества для разработки единых требований к обеспечению электронного документооборота</i>	<i>низкая</i>	<i>низкий</i>
6.	<i>Негативная общественная реакция на мероприятия приоритетного проекта</i>	<i>Не достигнуты цели проекта в части обращений граждан к электронным услугам (сервисам) Личного кабинета «Мое здоровье» на ЕПГУ</i>	<i>Популяризация концепции электронного здравоохранения, освещение деятельности участников проекта в средствах массовой информации</i>	<i>средняя</i>	<i>низкий</i>

6. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	<i>Улучшение состояния здоровья населения</i>	<i>Снижение показателей смертности населения. Улучшение показателей здоровья населения</i>	<i>Повышение доступности медицинской помощи населению, снижение нагрузки на медицинские организации первичного звена за счет перевода части оказываемых гражданам услуг по получению медицинских документов в электронный вид, контроль удовлетворенности граждан работой медицинских организаций за счет использования Личного кабинета «Мое здоровье» на ЕПГУ.</i>	<i>высокая</i>	<i>высокий</i>

7. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование этапа, задачи	Федеральный бюджет, млн руб.					Бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе внебюджетные источники	Всего ² , млн руб.
		2017	2018	2019	2020	2025		
1.	Этапы создания Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ ³	-	-	-	-	-	До 2018 в рамках реализации «дорожных карт» ⁴ . После 2018 будет уточнено по итогам исполнения «дорожных карт» ⁵	-
2.	Этапы организации и инфраструктурного программного обеспечения системы здравоохранения	811,67	736,78	740	654	2680		5622,45
2.1	Федеральный центр обработки данных. Основная площадка	187,08	187,54	187	187	935		1683,62
2.2	Федеральный центр обработки данных. Резервная площадка	187,08	187,54	187	187	935		1683,62
2.3	Федеральный центр обработки данных. Тестовая площадка	76,6	76,72	77	40	40		310,32
2.4	Поддержка ключевых компонентов ЕГИЗ	140,86	145,79	145	130	650		1211,65
2.5	Развитие компонентов ЕГИСЗ	220,05	139,19	144	110	120		733,24
ИТОГО		811,67	736,78	740	654	2680		5622,45

² Бюджет проекта на обеспечение федеральных компонентов ЕГИСЗ, без учета бюджета субъектов Российской Федерации

³ Работы по созданию Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ реализуются за счет средств предусмотренных на развитие компонентов Электронного Правительства Минкомсвязи России

⁴ Реализация проекта на уровне субъектов Российской Федерации до 2018 года осуществляется в рамках планов мероприятий («дорожных карт») по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015-2018 гг., утвержденных в рамках соглашений, заключенных между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

⁵ Бюджет проекта на уровне субъектов Российской Федерации после 2018 года будет уточнен по результатам исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015-2018 гг.
